

AGS Invoer



DÉ NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR EXPEDITIE EN LOGISTIEK



Agenda

- * Presentatie Douane
- * Vragen
- * Presentatie Fenex
- * Afsluiting



AGS Invoer



DÉ NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR EXPEDITIE EN LOGISTIEK



Agenda

- * Veranderingen AGS
- * Betrokkenheid bedrijfsleven
- * Stand van zaken techniek en gebruikerswensen
- * Stand van zaken implementatie
- * Afspraken
- * Aandachtspunten en advies



Veranderingen AGS

Niet alleen technische wijziging!

- * Andere berichtenstructuur
- * Velden op andere plek – WDO datamodel (containers, DV1)
- * Nieuwe codes
- * Anders communiceren (BWS, Correctie, Vooraf, etc)
- * Service berichten anders
- * Douane Tarief Voorziening (DTV)
- * Meer businessrules (checks)




Betrokkenheid bedrijfsleven invoering AGS

Drie partijen

- * Douane/B-CA
- * Softwareleveranciers/-ontwikkelaars
- * Aangevers – (douane) expediteurs ca 90%



Betrokkenheid bedrijfsleven invoering AGS

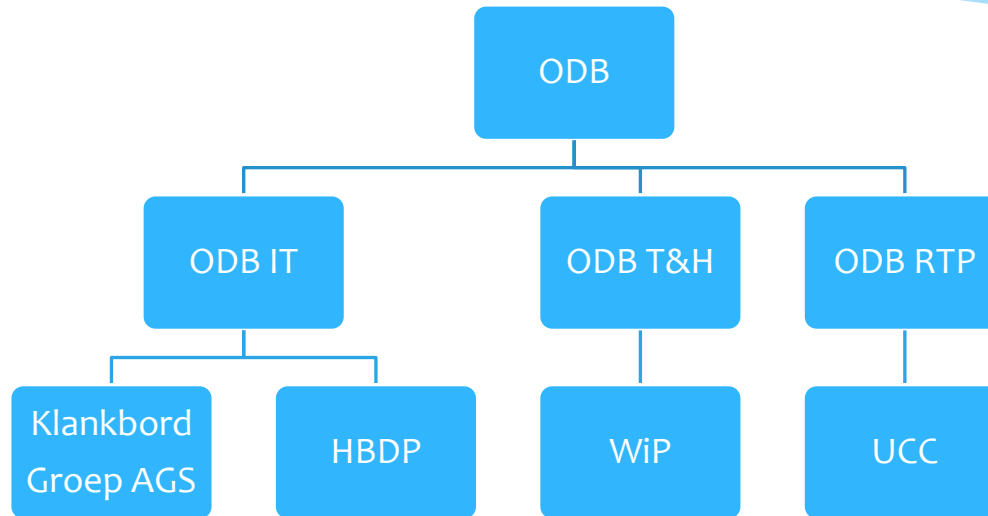

Betrokkenheid bedrijfsleven invoering AGS

Niet altijd eens en soms felle discussie, maar 1 gezamenlijk doel:

Kwalitatief goed over met zo weinig mogelijk gedoe/fouten




Betrokkenheid bedrijfsleven invoering AGS

Wekelijks overleg

- * Stand v zaken techniek
- * Stand v zaken implementatie
- * Stand v zaken communicatie



Stand van zaken techniek

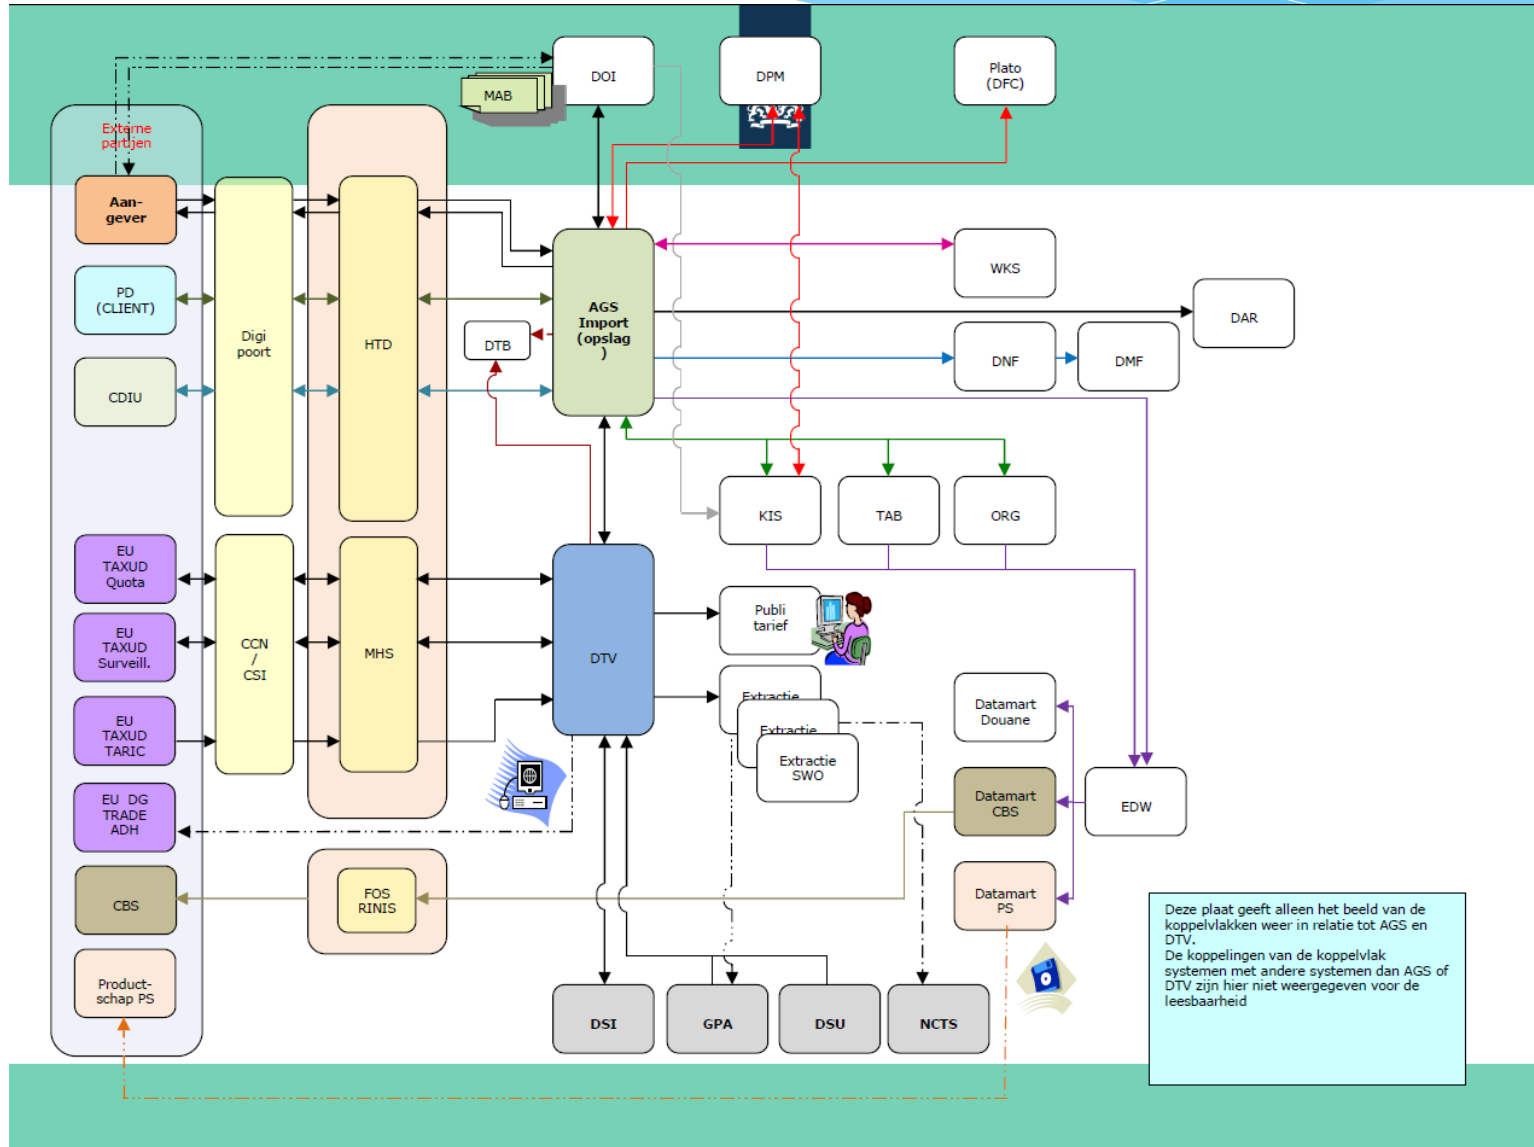

Stand van zaken techniek

- * Technisch live 6 oktober 2013
- * 1^e aangifte 21 oktober 2013
- * Grote releases 1-12, 15-12, 6-2, 23-2 en 6-4
- * Op dit moment kunnen bijna alle soorten aangiften en goederen
- * Nog te doen;
 - * performance DTV,
 - * Koppeling DTV en Download
 - * Ondernemersinfo ,zekerheid, wisselkoersen
 - * SAGOGA & Importeursoverzicht (juli)
 - * Ontwerpfout Verlegging (mei – juni)
 - * Overige aanpassingen (zsm)



Stand van zaken implementatie

3 Fases bij implementatie

* Pre fase	Testperiode	oktober tot maart
* Fase 1	Vrijwillig	maart t/m april
* Fase 2	Algemene overgang	mei t/m juni
* Fase 3	Veegronde	uiterlijk juli



Stand van zaken implementatie

Opschalingsstrategie Fase 2 + 3

- * Overgangperiode duurt in principe 13 weken
- * Starten in blokken van drie weken
- * Evaluatie met bedrijfsleven en SWL's na eerste blok
- * Inplannen overgang in 10 weken, laatste 3 weken veegperiode
- * Planning wordt gemaakt door CA ism SWL's -> akkoord aangever
- * Zorg dragen voor goede spreiding over de totale periode



Stand van zaken implementatie

- * 150 bedrijven aangesloten
- * Nu 400-500 aangiften per dag
- * **Niet geaccepteerde aangiften daalt snel, maar is nog te hoog (25%)**
- * Wordt gemonitord op SWL en aangever
- * “Fouten”, tips en trucs worden beschikbaar gesteld aan aangevers en SWL via:
 - * FAQ etc. op Douane.nl
 - * Individuele gesprekken met aangevers en SWL
 - * Nieuw in te richten community tbv aangevers
 - * Webinars 1 mei, 22 mei en 12 juni



Stand van zaken implementatie

Vragen

Wie is al aangesloten op AGS?

Wie is tevreden over AGS tot nu?

Wat moet nog gebeuren?

Wat kan beter?

Zijn er bedrijven die nog niet weten wanneer overgang?



Stand van zaken implementatie

Ervaring bedrijfsleven tot nu

Het is even wennen, maar:

- * Eenvoudige aangiften gaan redelijk tot goed
- * Ingewikkelde aangiften van beide kanten nog zoeken (douane & bedrijfsleven)
- * Fouten/vragen blijven verzamelen en communiceren
- * Soms lastig juiste info via juiste kanaal



Afspraken

Overgangsfase kan niet eerder starten dan bij:

- * Technisch werkend AGS en DTV
- * Aanvaardbaar aantal “foute” (afgekeurde) aangiften
- * Opschalingsverhinderende aspecten opgelost



Afspraken

Uitgangspunten:

- Primaire belang: kwalitatief goed over met zo weinig mogelijk gedoe/fouten
- Zo veel mogelijk individuele benadering bedrijven met behoefte daaraan/of noodzaak
- Iedere aangever 5 dagen geleidelijk over, op geldig verzoek langer
- Snelheid ivm implementatie en kosten niet uit het oog verliezen
- Voor besluitvorming overleg met bedrijfsleven en ADS of “we”er klaar voor zijn
- Mocht het niet lukken, dan in overleg flexibel mee omgaan



Afspraken

29 april Go – No Go Klankbordgroep

Zijn we er klaar voor???



Aandachtspunten en advies

Software leverancier

- * Wees kritisch en alert!
- * Niet uw (interne) leverancier, maar uzelf bent verantwoordelijk
- * Verdiepen en eigen maken
- * Vergelijk met toelichting Enig Document
- * IT is ons gereedschap
- * **TESTEN TESTEN TESTEN!!!**



Aandachtspunten en advies

Eigen organisatie

- * Bepaal het belang en de impact op de bedrijfsvoering
- * Maak een planning (big bang – geleidelijk)
- * Verdiepen en blijven volgen
- * Begin met eenvoudige aangiften
- * Betrek de juiste personen
- * Begin zo vroeg mogelijk



Afsluiting

Bedankt voor uw aandacht en succes!



willems@fenex.nl

088-4567400

Dominique Willems

